

# SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA U GOSPODARSKOJ ZONI BREZJE – STANJE PROJEKTA

GRAD VARAŽDIN  
GRADONAČELNIK

dr.sc. Neven Bosilj



Varaždin, 11.06.2024.

# UGOVORI NA PROJEKTU

## **1. Ugovor o sanaciji zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje, Grad Varaždin**

**Datum potpisa ugovora:** 18.12.2023.

**Zajednica ponuditelja:** CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. i HIS d.o.o.

**Datum uvođenja u posao:** 16.01.2024.

**Rok izvođenja radova:** 18 mjeseci od uvođenja Izvođača u posao (16.07.2026.)

**Vrijednost ugovora:** 23.011.689,56 EUR + PDV = **28.764.611,95 EUR**

# UGOVORI NA PROJEKTU

## 2. Ugovor o stručnom nadzoru i usluzi koordinatora zaštite na radu

**Datum potpisa ugovora:** 10.01.2024.

**Izvršitelj:** Hidro Una d.o.o.

**Vrijednost ugovora:** 52.490,00 EUR bez PDV-a = **65.612,50 EUR**

## 3. Ugovor o pružanju usluga vanjskog voditelja projekta

**Izvršitelj:** Civil Engineering Consultancy d.o.o., Zadar

**Vrijednost ugovora:** 27.300 EUR + PDV = **34.125,00 EUR**

## 4. Ugovor za pružanje usluge ovlaštenika za nadzor nad izvođenjem radova sukladno sanacijskom programu

**Izvršitelj:** Promo Eko d.o.o., Osijek

**Vrijednost ugovora:** 12.300,00 EUR + PDV = **15.375,00 EUR**

# UGOVORI NA PROJEKTU

**5. Ugovor o nabavi usluge – Vidljivost i komunikacija s javnosti – sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje**

**Izvršitelj: Waves komunikacije d.o.o., Zagreb**

**Vrijednost ugovora: 28.950,00 EUR + PDV = 36.187,50 EUR**

**6. Ugovor o pružanju usluge koordinacije poslova vezanih uz provedbu projekta sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada u gospodarskoj zoni Brezje za 2024 godinu.**

**Izvršitelj: XP Ured d.o.o., Zagreb**

**Vrijednost ugovora: 15.996,00 EUR + PDV = 19.995,00 EUR**

# **ODLUKA VLADE RH O SANACIJI ODLAGALIŠTA BREZJE**

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o sanaciji zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji „Brezje“ Grad Varaždin od 16. studenog 2023. godine određeno je da će Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost osigurati sredstva u iznosu

**najviše do 29.164.611,95 EUR s PDV-om**

što čini **100 %** procijenjenih i opravdanih troškova Projekta.

# FINANCIRANJE PROJEKTA OD STRANE FZOEU

**Naziv Ugovora:** Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona „Brezje“ Grad Varaždin, davanjem sredstava pomoći

**Datum potpisa:** 06.02.2024. u Varaždinu

**Vrijednost Ugovora:** do 29.164.611,95 EUR (PDV uključen i predstavlja prihvatljiv trošak)

**Razdoblje provedbe Projekta po Ugovoru:** započinje danom stupanja na snagu Odluke Vlade RH, odnosno 16. studenog 2023., a završava najkasnije 30. rujna 2026.

**Razdoblje prihvatljivosti troškova:** od 16. studenog 2023. do 31. prosinca 2026.

# STANJE PROJEKTA NA DAN 07.06.2024.

Zaključno sa 07.06.2024. (petak)  
odvezeno je ukupno:

**17.660 tona otpada = 24.551 bala**

**što čini 19,64% od ukupnog broja  
bala (125.000) koliko ih je na lokaciji**





# Oporaba otpada



Struktura otpada



Otpad koji se dovozi na obradu iz donjih slojeva odlagališta ima visok stupanj vlage (doseže i do 50%) što rezultira produženjem vremena sušenja pa samim tim i produženo vrijeme obrade.

Takav otpad (koji se tijekom godina djelomično razgradio) natopljen vodom lijepi se za pojedine dijelove postrojenja i usporava proces obrade.

U tijeku je utvrđivanje količina i strukture takvog otpada posebnom metodom uzorkovanja i analize predloženom od akreditiranih laboratorija.


Za sada će se odvoziti i na obradu slati bale iz gornjih slojeva.







Stanje podloge nakon uklanjanja bala

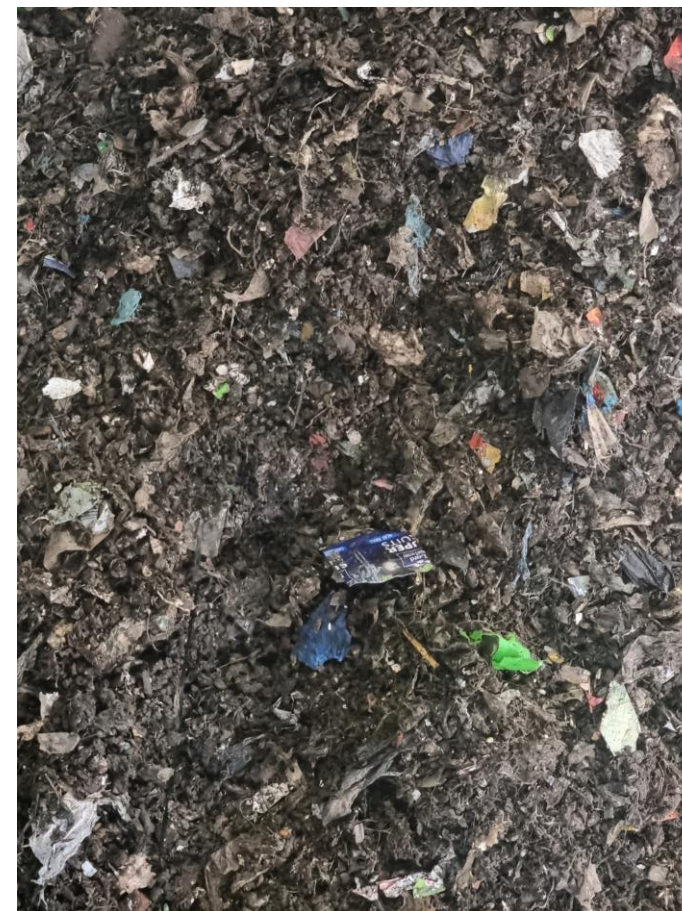

Izgled otpada iz donjih slojeva



# FINANCIJSKA REALIZACIJA PROJEKTA

Zaključno sa 31.05.2024. na Projektu je izvedeno radova u vrijednosti:

**3.483.653,03 EUR + PDV = 4.354.566,41 EUR**

što čini **15,14 %** vrijednosti ugovora o sanaciji





Hvala na pažnji!

GRAD VARAŽDIN

Gradonačelnik, dr.sc. Neven Bosilj
